

Informe de Ejecución presupuestaria del Portafolio de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura del Instituto Nacional de las Mujeres, al 31 de diciembre del 2022.



Dirección Administrativa Financiera

- ✓ Zaida Barboza Hernández, Directora Administrativa Financiera.
- ✓ Amanda Ocampo Mora, Profesional Especialista en Proyectos de Inversión.
- ✓ José Ramírez Murillo, Ingeniero Civil.

CONTENIDO

Proyectos del Portafolio

1. Proyectos Sede Central Zapote.
2. Proyecto CEAAM Caribe
3. Proyecto Pacífico Central
4. Proyecto Huetar Caribe
5. Proyecto CEAAM AM
6. Proyecto Huetar Norte
7. Proyecto Brunca



1. Proyecto Sede Central del INAMU

Suspendido

Ejecución presupuestaria en el período 2022: (Ø0)

Porcentaje de cumplimiento de avance físico en el Portafolio Institucional: 6,43% de 14,29%.

IMPORTANTE: INAMU-PE-DAF-740-2022. Propuesta Ciudad Gobierno.



2. Proyecto CEAAM Caribe

ALCANZADO

- ❖ Ejecución presupuestaria en el período 2022: (C\$0)
- ❖ Porcentaje de cumplimiento de avance físico en el Portafolio Institucional: 14,29% de 14,29%.



3. Proyecto Pacífico Central






ESTADO:
Ejecución de la
construcción con un
avance del 26,71%
según la metodología
Cartelería del Pre-2.


fecha de entrega: Abril
2023



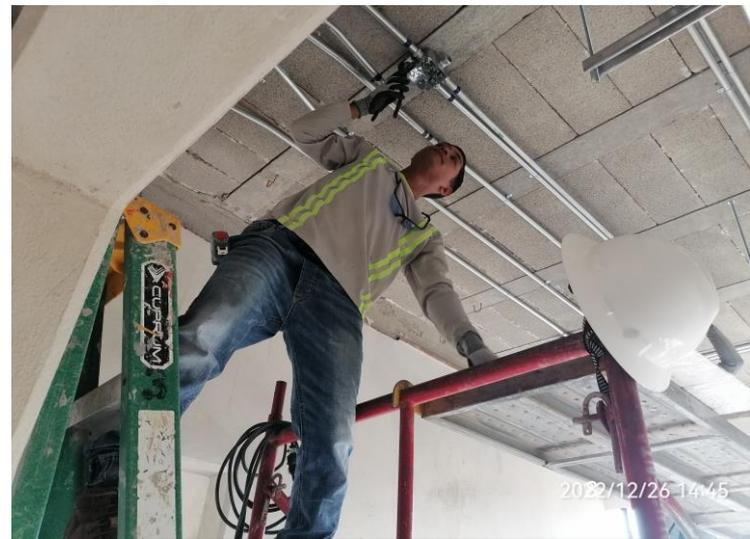

Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2022


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

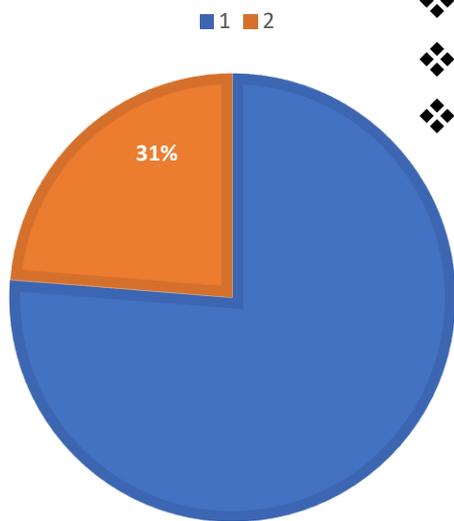

- ❖ Valor 1 : Costo total del Proyecto ₡ 2 743 559 938,00
- ❖ Valor 2: Costo Ejecutado: ₡ 854 424 438,00
- ❖ Porcentaje de ejecución 31%

Proyección de ejecución durante el 2023

INVERSION PACÍFICO CENTRAL

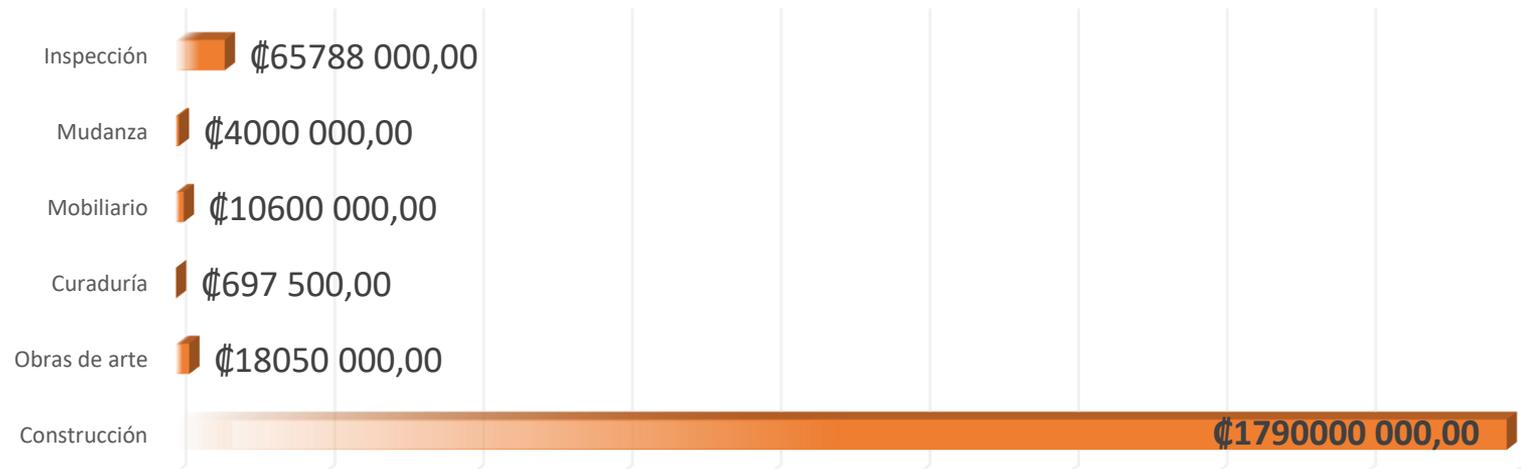


Actualización al 31 de diciembre del 2022

- El monto ejecutado por concepto de la ejecución de la construcción
- El monto ejecutado por concepto de la inspección.
- Monto ejecutado por concepto de los servicios de curaduría para la compra de obras de arte de colección estatal.

Doscientos millones doscientos treinta y dos mil setecientos ochenta y cinco colones con setenta y dos céntimos (¢200.232.785,72)

2. Porcentaje de avance en el Portafolio de Proyectos: 8% de 14, 29%

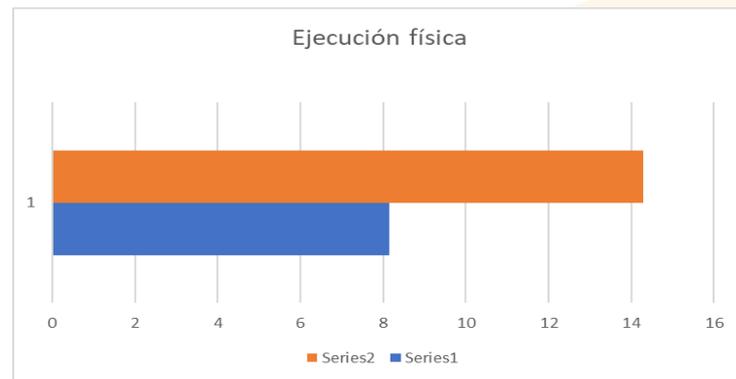

4. Regional Huetar Caribe




Bloque Administrativo

Vista Principal




ESTADO:
Ejecución de la construcción con un avance del 35,11% según la metodología Cartelería del Pre-2.



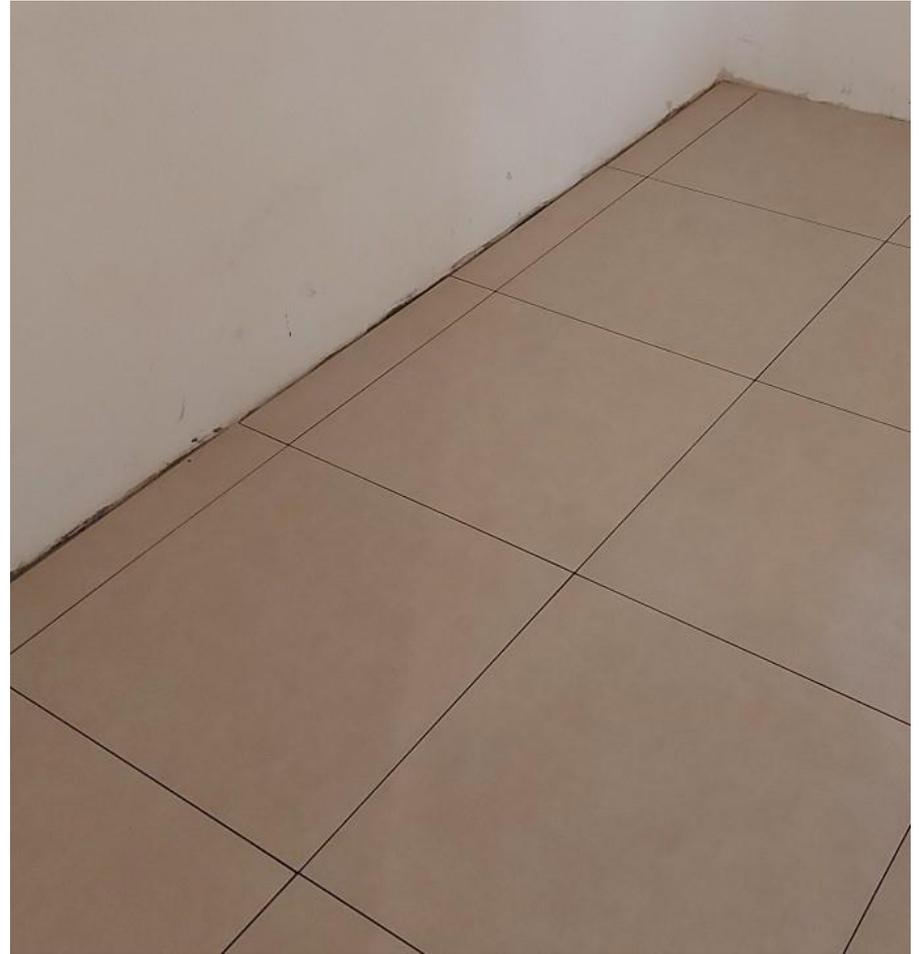

Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2022


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

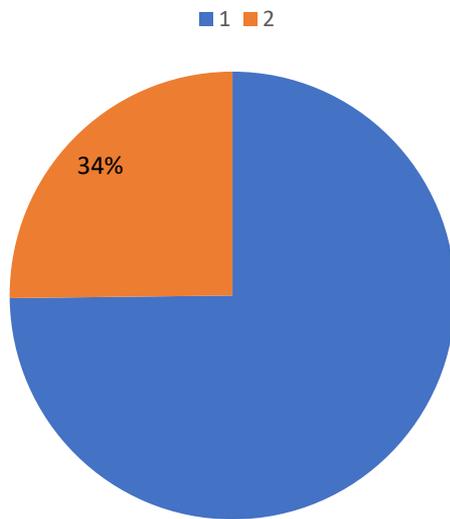

- ❖ Valor 1 : Costo total del Proyecto ₡ 2 998 024 204,89
- ❖ Valor 2: Costo Ejecutado: ₡1 009 381 804,89
- ❖ Porcentaje de ejecución 34%

Proyección de ejecución durante el 2023


Inversión Huetar Caribe

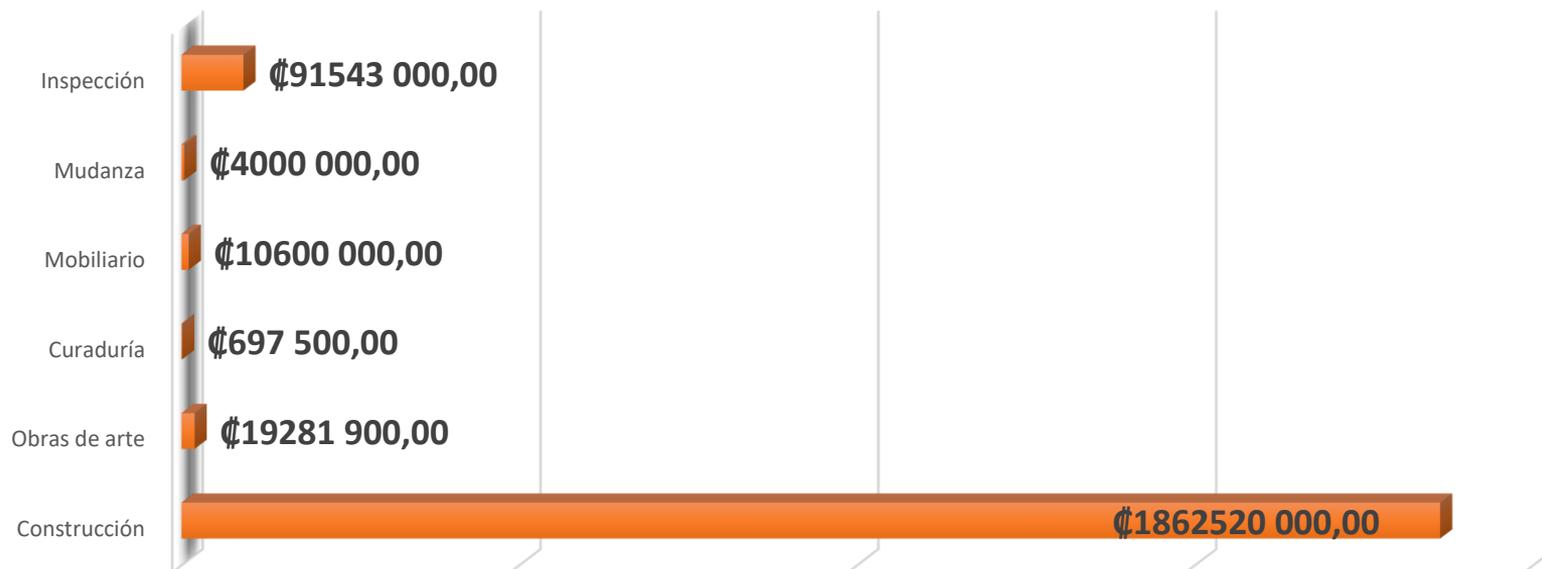

Actualización al 31 de diciembre del 2022

- El monto ejecutado por concepto de la ejecución de la construcción
- El monto ejecutado por concepto de la inspección.
- El monto ejecutado por concepto de la curaduría para la compra de las obras de colección estatal para las sedes regionales.
- trescientos seis millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos nueve colones con treinta y ocho céntimos. **(~~Q~~306.471.209,38).**

Porcentaje de avance en el Portafolio de Proyectos: 8,72% de 14, 29%.

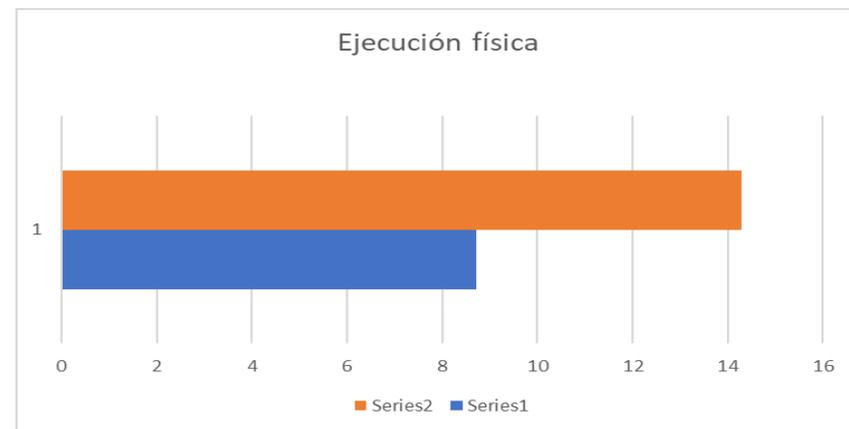

5. Proyecto CEAAM AM

- Análisis legal de terrenos del Estado propuestos por el MIVAH.

6. Proyecto Huetar Norte

- Proyecto con terreno propio.
- Mediante oficio INAMU-PE-DAF-586-2022 se solicitó autorización para el registro en el BPIP e incorporación en el POI 2023.
- INAMU-PE-0820-2022 : No se autoriza el registro.
- INAMU-PE-DAF-740-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 la Dirección Administrativa Financiera ha solicitado que se consideren los nuevos escenarios planteados por el levantamiento de la regla fiscal y el impacto que tiene esa decisión en los Proyectos del INAMU.

7. Proyecto Brunca

- Proyecto con terreno propio.
- No registra actividades.
- INAMU-PE-DAF-740-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 la Dirección Administrativa Financiera ha solicitado que se consideren los nuevos escenarios planteados por el levantamiento de la regla fiscal y el impacto que tiene esa decisión en los Proyectos del INAMU.

Ejecución total del Portafolio al 2022

22




	Total Presupuesto	Total ejecución	porcentaje
INAMU-01-2017 INAMU-UNOPS. 002692 BPIP	₡ 771 653 753,64	₡ 771 653 753,64	100,00%
INAMU-04-2018 CEAAM Caribe. 002693 BPIP	₡ 2 398 888 644,83	₡ 2 398 888 644,83	100,00%
INAMU-05-2018 Pacifico Central. 002695 BPI	₡ 2 743 559 938,00	₡ 854 424 438,00	31,14%
INAMU-06-2018 Regional Huetar Caribe. 002694 BPIP	₡ 2 998 024 204,89	₡ 1 009 381 804,89	33,67%
INAMU-02-2018 CEAAM AM. 003014 BPIP	₡ 3 329 343 065,47	₡ -	0,00%
	₡12 241 469 606,84	₡ 5 034 348 641,36	41,13%



Ejecución total del Portafolio al 2022

Portafolio de Proyectos de Inversión Pública
Avance físico

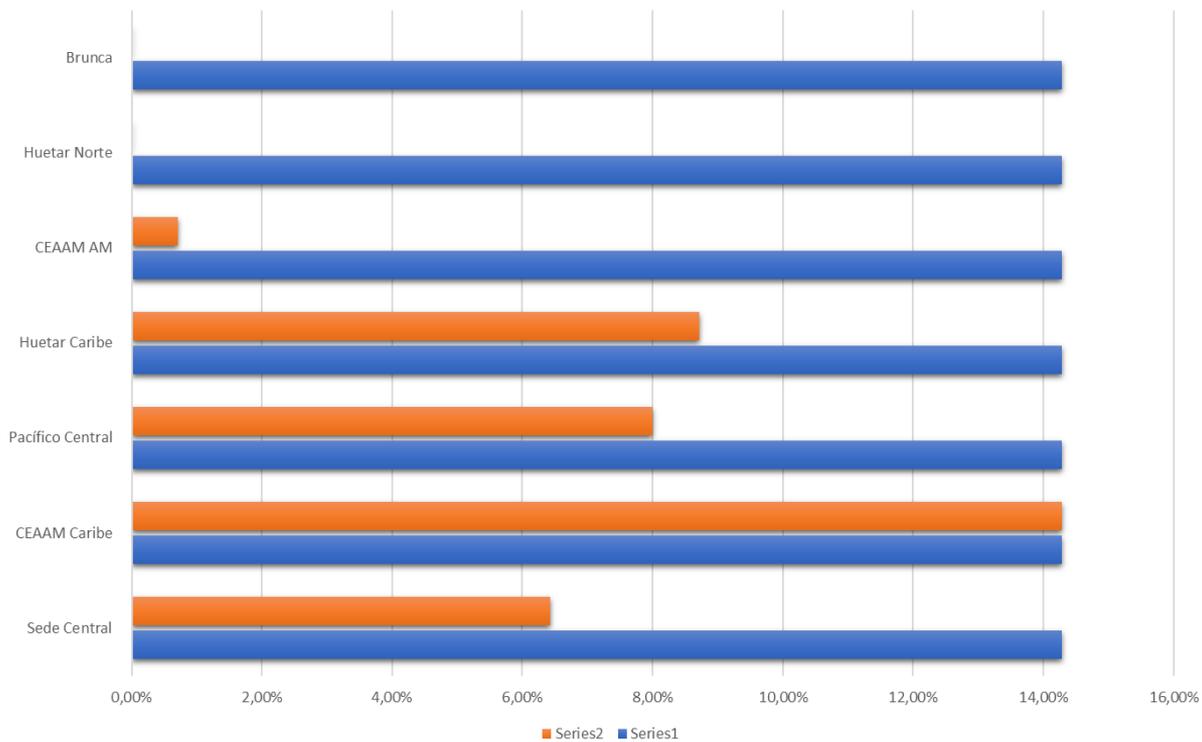

38,16% del 100%
1 edificio terminado de 7

Línea azul: meta
Línea naranja: Alcanzado.

**Valorar la prioridad
Institucional**

